




## 正式名称が『東棟』に決定！

「新棟」という名称で建設工事を進めてまいりましたが、病院職員から候補を募り、正式名称を『東棟』と決めました。これからは『東棟』とお呼びください。なお、このお知らせの名称も今回から『東棟(新棟) 建設ニュース』に変更しました。

## 配線と配管工事も進んでいます

3月は、建物内部では下の写真のとおり、部屋の間仕切り工事が行われ、部屋や廊下の位置が分かるようになってきました。併せて、空調機器の取り付けや電気配線工事が順次進められています。

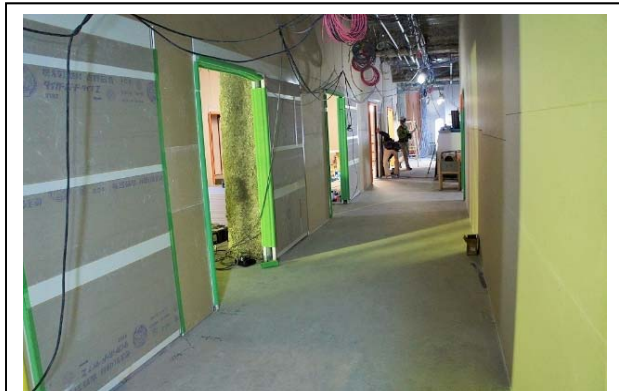

部屋の間仕切り工事が行われました



空調機器の取り付けも行われました

## 水道引込管取り替えのための試掘が行われました

前回お知らせしましたとおり、新棟建設に伴い、水道使用量の増加が見込まれることから、院内への水道引込管取り替えが必要となります。その取り替えに先立ち、病院北側国道の歩道を試掘しました。歩道の下には、水道管、電気の埋設管、ガス管などいろいろな管がありました。



病院北側国道の歩道を試掘しました

## 4月の工事予定

・4月中旬から東棟(新棟)と南棟を接続する工事が始まります。2階では産婦人科外来横の医師当直室を解体し、渡り廊下として整備した上で、新棟竣工に合わせて接続します。産婦人科外来では解体の大きな工事音がありますが、ご容赦いただきますようお願いいたします。また、視能訓練室も移動になります。(移動場所は別途お知らせします。)

・建物の外部では、外装吹付工事が実施された後、屋上に電気・空調設備機器を搬入し、接続工事が行われます。また、中旬から足場が解体され、正面玄関上の庇(ひさし)の仕上げが行われます。

なお、4月15日(土)午前中に東棟(新棟)南側の市道を通行止めにして、屋上へクレーンで機器を吊り上げます。誘導員を配置してご案内いたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

内部が見えてきて、完成が待ち遠しいですね。

